

令和元年度 第2回 栃木県公共事業評価委員会 一括審議箇所一覧表


事業区分	事業名		事業延長 ・計画諸元	全体 事業費 (億円)	事業 期間	事業進捗 [用地補償] (事業費ベース)	事業全体 B/C	事業の主な変更点及び理由	再評価の視点	対応方針 (案)
河川	3	安全な川づくり事業 一級河川 巴波川	L=800m W=16.9m	(23.4) 25.6億円	H22年度 (R6) ~R9年度	28% [25%]	5.2	用地買収の遅れから計画事業期間を 延伸する。また、労務単価の上昇及び 消費税の増税により全体事業費を見 直すものである。	本事業区間は市街地を流れる河川 であり、出水時には浸水被害が発生し ている。 当該事業は、事業区間のみならず、 事業区間下流の栃木市街地の浸水被 害解消も見込んでいるため、事業の 必要性が高く、引き続き事業を継続す ることが妥当と考える。	継続

事業箇所(位置図、概要図)

位置図



標準横断面図

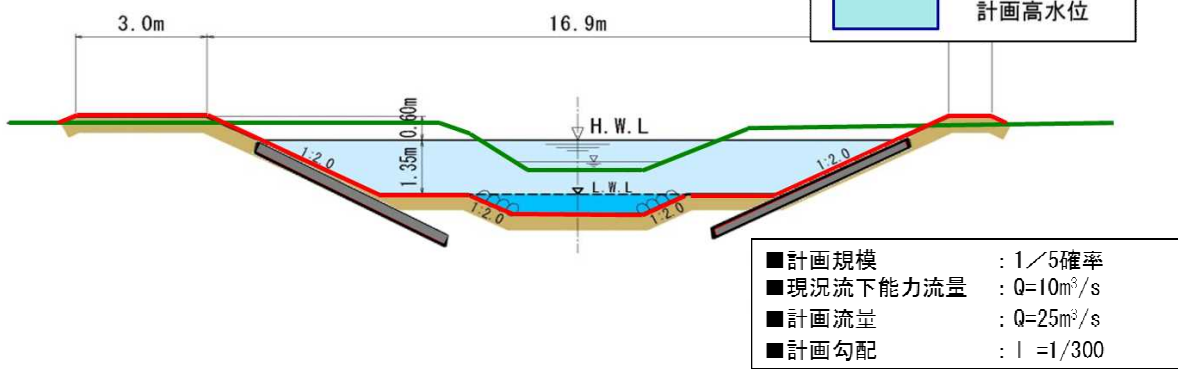

概要図

