

令和6年度 第1回 栃木県公共事業評価委員会 一括審議案件一覧

事業区分	事業名		事業延長 ・計画諸元	全体 事業費 (億円)	事業 期間	事業進捗 [用地補償] (事業費ベース)	事業全体 B/C	事業の主な変更点及び理由	再評価の視点	対応方針 (原案)
街路	1	街路づくり事業 日光都市計画道路3・4・ 20号外2路線 平町東町線 日光市 下今市	L=620m W=20.0m	(27.3) 29.8	(R7) H25～R8	91% [100%]	1.0	<ul style="list-style-type: none"> 全体事業費の増額 理由:労務資材単価の高騰、住宅建築資材の高騰等による増額 計画事業期間の延伸 理由:電線共同溝施工に係る占用事業者との調整の結果、所要の施工期間が必要となったため 	本事業箇所は、事業用地を全て取得済みであり、工事も71%実施していることから、引き続き現計画で事業を継続することが妥当と考える。	継続
街路	2	街路づくり事業 宇都宮都市計画道路3・ 4・502号 祖母井中央通り 芳賀町 祖母井	L=600m W=17.0m	(22.0) 22.9	(R6) H25～R11	96% [97%]	1.0	<ul style="list-style-type: none"> 全体事業費の増額 理由:労務資材単価の高騰、住宅建築資材の高騰等による増額 計画事業期間の延伸 理由:用地取得に不測の時間を要しているため 	本事業箇所は、用地を97%取得済みであり、工事も92%実施していることから、引き続き現計画で事業を継続することが妥当と考える。	継続

街路づくり事業 宇都宮都市計画道路 3・5・502号 祖母井中央通り 事業概要

路線・河川名 事業区間	事業延長 計画諸元	全体事業費 (億円)	事業期間	事業進捗 【用地補償】 (事業費 ベース)	事業全体 B/C
宇都宮都市計画道路 3・5・502号祖母井中央通り 芳賀町 祖母井	L=600m W=17.0m	(22.0) 22.9	(R6) H25~R11	96% 【97%】	1.0


事業の整備効果等

- ・ 歩行者と自転車の安全で快適な道路環境の形成
- ・ 右折レーン整備による都市内交通の円滑化
- ・ 芳賀町との連携による中心市街地の活性化への寄与

整備内容 現道拡幅



位置図

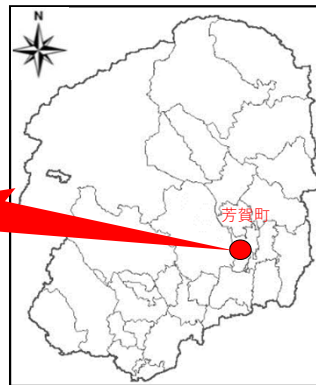

<歩道未整備箇所>




<現在の整備状況>



標準横断面図

<現況>

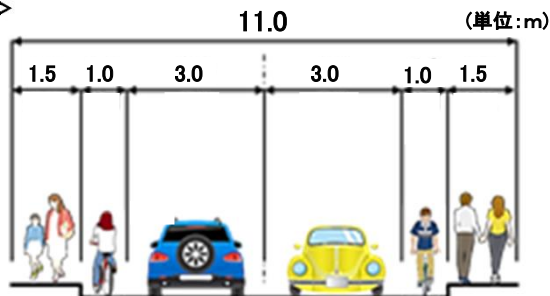

<計画>

