

巴波川 改良復旧事業の計画変更について

令和6(2024)年3月12日

県土整備部河川課


◆事業期間延伸

- 当初計画：令和2年度～令和7年度 ⇒ 変更計画：令和2年度～令和9年度（2年延伸）
- 理由：地下捷水路流入施設の計画変更等に伴う事業期間の延伸

◆事業費

- 当初計画：153億円 ⇒ 変更計画：178億円（25億円増額）
- 理由：物価高騰等による全体事業費の増額

上記内容は、現時点の予定であり、今後の事業進捗により、変更となる場合があります。

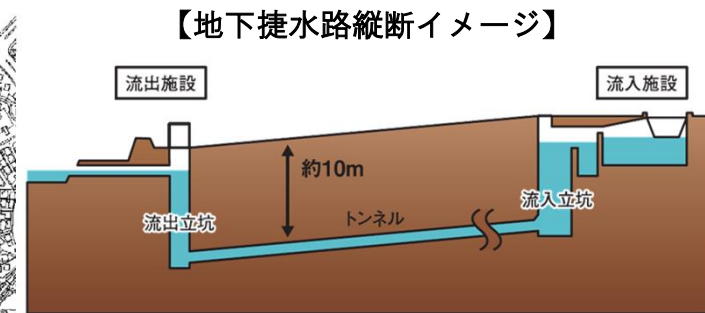

【地下捷水路断面図】

