

巴波川地下捷水路（地下トンネル河川）工事のお知らせ

令和7年 12月

奥村・岩田地崎特定建設工事共同企業体
栃木県 栃木土木事務所

◆はじめに

師走を迎え何かと慌ただしい時期となりました。皆様におかれましては、日ごろから「巴波川地下捷水路(しょうすいろ)整備事業」に深いご理解と多大なるご協力をいただき感謝申し上げます。


巴波川地下捷水路本体建設工事に関しまして、工事進捗状況、シールド機の現在位置、地表面測定結果、今後の掘進予定等について、以下のとおりお知らせいたします。

◆工事進捗状況

【R7年 11 月下旬現在 シールドトンネル施工済み延長 830m／計画延長 2,409.5m】

シールド機は、現在、蔵の街大通りの「コエド市場」付近を掘進しています。1日に10m程度進む計画です。工事は、昼・夜とも作業もおこないます。昼間にのみ、資機材をトレーラー等で搬入したり、掘削土砂をダンプで搬出する作業をおこなっています。夜間は、音や光が極力漏れないように、防音建屋を閉め切った中で作業をおこなっています。

◆シールド機の現在位置

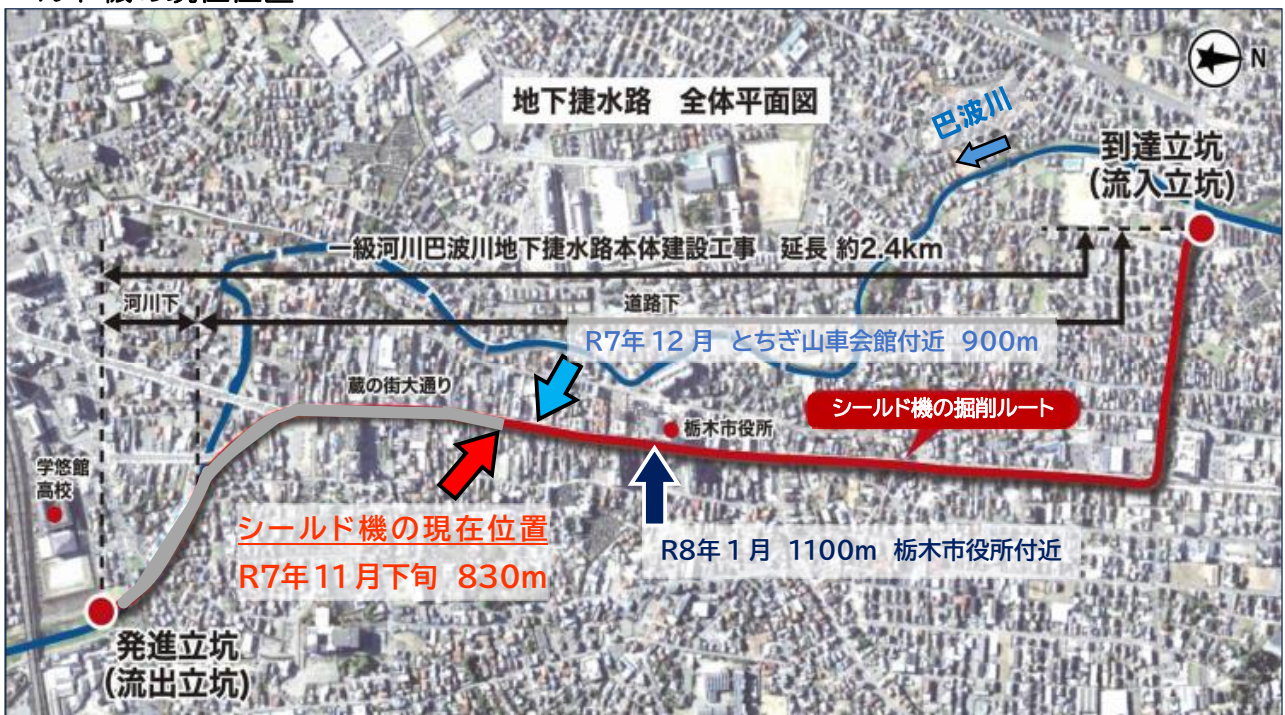


◆地表面測定結果

シールド機によるトンネル掘削の影響を調べるために、20m間隔で測定ポイントを設け、地表面の高さを測定しています。

シールド機が通過する1週間前から測定を開始して、通過中は毎日、通過後も一定期間(概ね6ヶ月間)測定します。

現在までのところ、変位量に異常はありません。

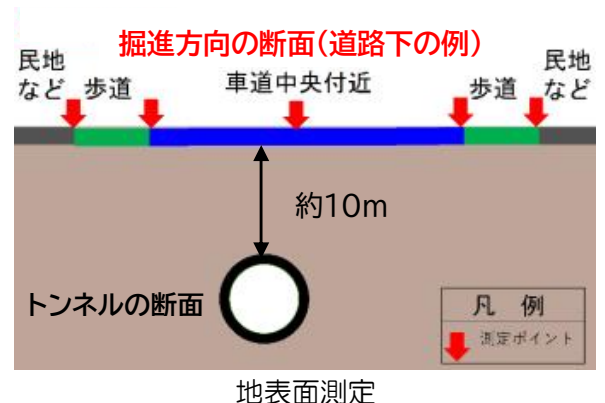

◆今後の掘進予定

工事の内容	年月	令和8年（2026年）								
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
トンネル掘削・築造 (シールド機による)										到達▼
概略位置 及び トンネル掘進距離(累計)		▼とちぎ山車会館付近 (900m)		▼梶木市役所付近 (1,100m)		▼隼乃珈琲店付近 (1,700m)		▼足利銀行新栃木支店付近 (1,960m)		

※工事の状況により変更することがありますのでご了承ください

◆現場紹介

シールド機で掘削した土砂や泥水を処理する設備を写真にてご紹介します。

①掘削した土砂のうち砂や石を処理する設備の全景（組立状況）です。今は高さ14mの防音建屋ですっぽりと覆われています。



②処理設備のうち振動篩（ふるい）によって泥水から砂を分離している状況です。分離処理水はトンネル掘削に再利用します。



◆おわりに

今後も、安全・安心を最優先に工事を進めてまいりますので、お気づきの点がございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

引き続き、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

*工事の進捗状況につきましては、巴波川地下捷水路（しょうすいろ）整備事業のホームページにも掲示しております。下記のQRコードから、又は、インターネット検索「街なか守る巴波川」にて、ご覧いただけます。

◆お問い合わせ先

◇奥村・岩田地崎特定建設工事共同企業体
〒328-0053 栃木市片柳町1-22-7
メゾン・シェーナ 102号室
TEL：080-7712-0874

◇栃木県栃木土木事務所改良復旧部
〒328-8504 栃木市神田町6-6
TEL：0282-23-3921



<回覧の取扱>

*本回覧は、シールド機が今後1ヶ月間に通過すると想定される自治会に配布しております。

*本回覧は、栃木土木事務所ホームページに毎月掲載いたします。「地下捷水路沿川自治会へのお知らせ」

*本回覧とは別に、巴波川地下捷水路の関係自治会全体に、3ヶ月に1回の回覧を配布いたします。
