

1 作業概要

- (1) 実施期間：平成24年10月4日から同月7日まで
- (2) 対象施設：北那須水道事務所内の見学用通路及び側溝
- (3) 除染方法：アスファルト舗装面洗浄及び側溝の清掃

①アスファルト舗装面洗浄


路面清掃車で表面清掃し、その後洗浄。



路面清掃による除染状況



洗浄による除染状況

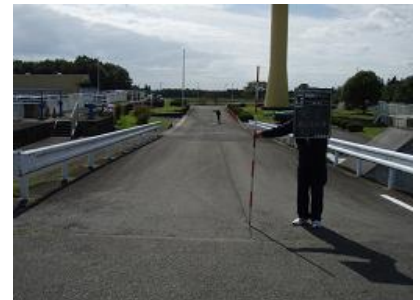

除染後

②側溝の清掃

人力にて土砂撤去、洗浄。



土砂撤去による除染状況



洗浄による除染状況



除染後

2 除染結果

No	除染方法	空間放射線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		備考
		除染前	除染後	
1	舗装面洗浄及び側溝の清掃	平均0.253	平均0.237	

3 今後の対応について

今後は、定期的に空間放射線量の測定を行い、除染効果の継続について経過観察を行う。
