

根固めブロックを製作中です

～水管理の安全・省力化を目指して～

那珂川にある堀抜用水堰（那須烏山市）の工事を行っています。この工事は県営農業用河川工作物応急対策事業であり、洪水による災害の防止を目的に行っています。

現在は、新設予定の護岸が洪水等により流されるのを防ぐため、護岸の前面に設置する根固めブロックを製作しています。

根固めブロックは117個製作予定で、非出水期の11月以降に設置する予定です。

工事完成後は、ゲート操作位置が高くなり安全な水管理ができるようになるほか、改築する取水口により、流木・草・ごみ等が溜まらなくなることで維持管理費用・労力を減らすことができます。

～根固めブロック製作の様子～



生コンクリート打設作業



打設された生コンクリート




養生



完成した根固めブロック

～堀抜用水堰～

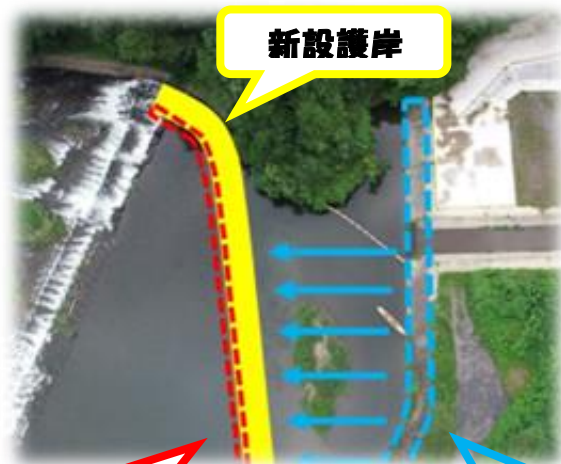

新設護岸

ブロック設置

現在の護岸
