

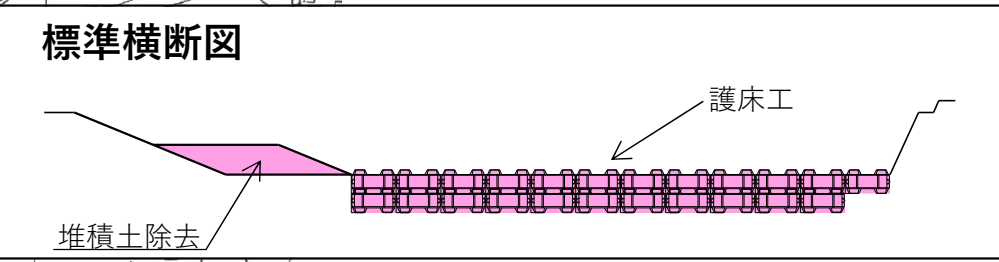


堆積土の除去及び護床工について 行川 日光市小代

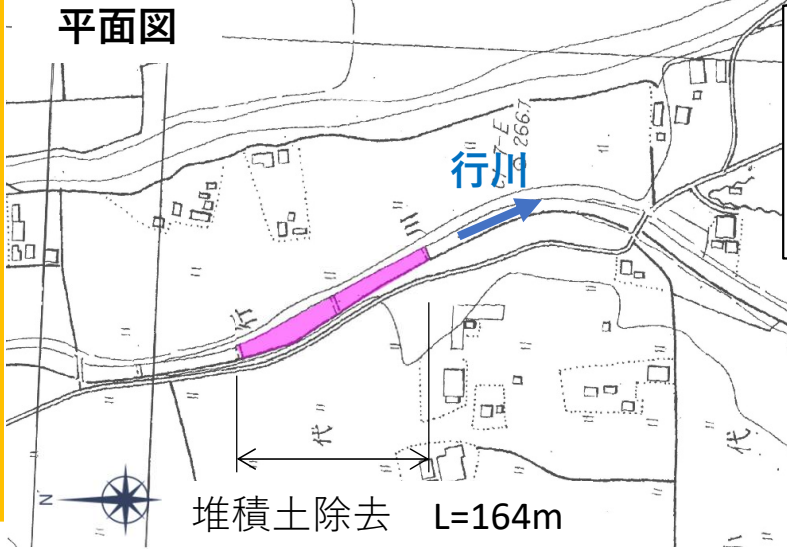

【実施内容】

- ・堆積土除去 V=540m³
- ・護床工 A=154m²

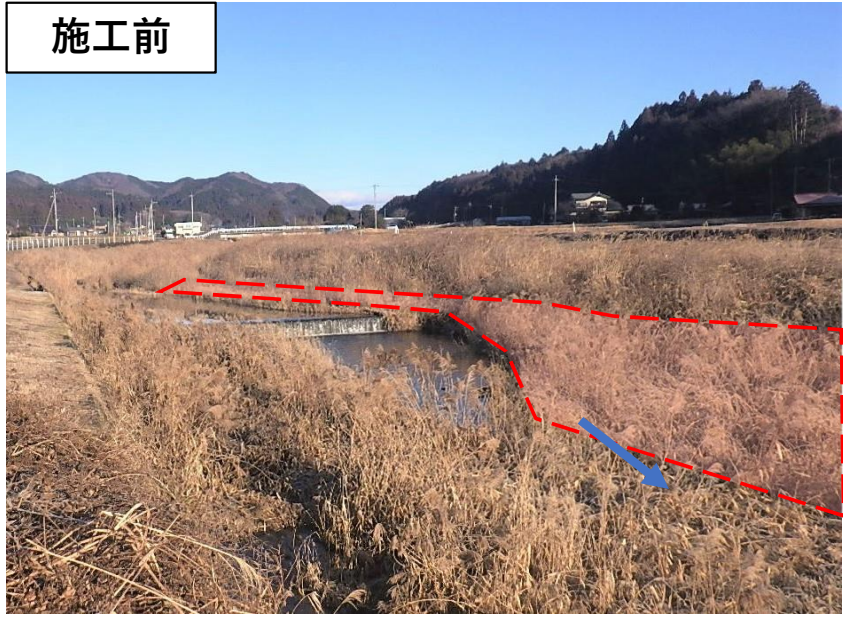

〈事業効果〉
 堆積土除去及び護床工を実施したことにより、河床を安定させるとともに、護岸満杯で流れる洪水の水位を約10cm低くすることが期待できます。（※低下水位の値は堆積土除去量からの推測値）
