


堤防強化について 荒川 那須烏山市高瀬 高瀬大橋下


位置図



平面図

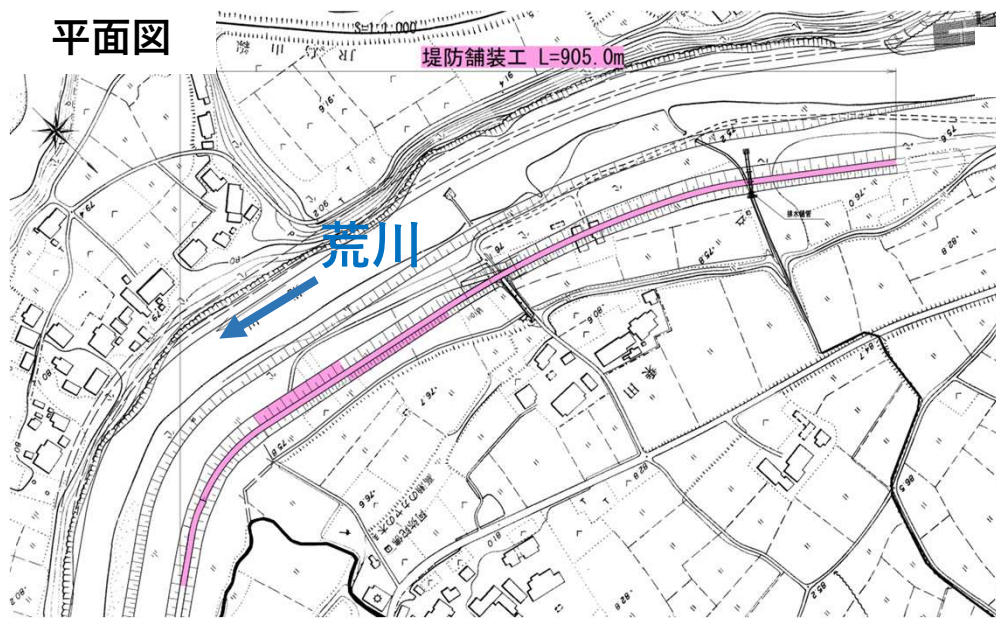

標準横断図

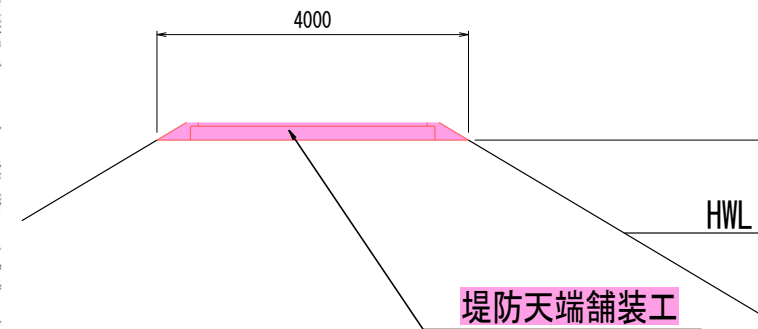

【実施内容】

・堤防天端舗装工 $A=2,646m^2$

施工前



施工後



〈事業効果〉

堤防天端舗装の施工により、堤防への雨水の進入を防ぎ、堤防の強靱化を図るとともに、地震時のパトロールや水防活動等の際、緊急車両が確実に走行できる機能を確保した。
