

令和5年度工事の状況（椎谷地区） Vol.3


第2工区ため池改修工事

令和6（2024）年3月11日撮影



工事中のため池

池敷の土を剥ぎ取り、赤土を敷き詰めています。
透水性の低い粘土質の赤土を使用することで、ため池からの漏水を防ぐことができます（**ブランケット工法**）。

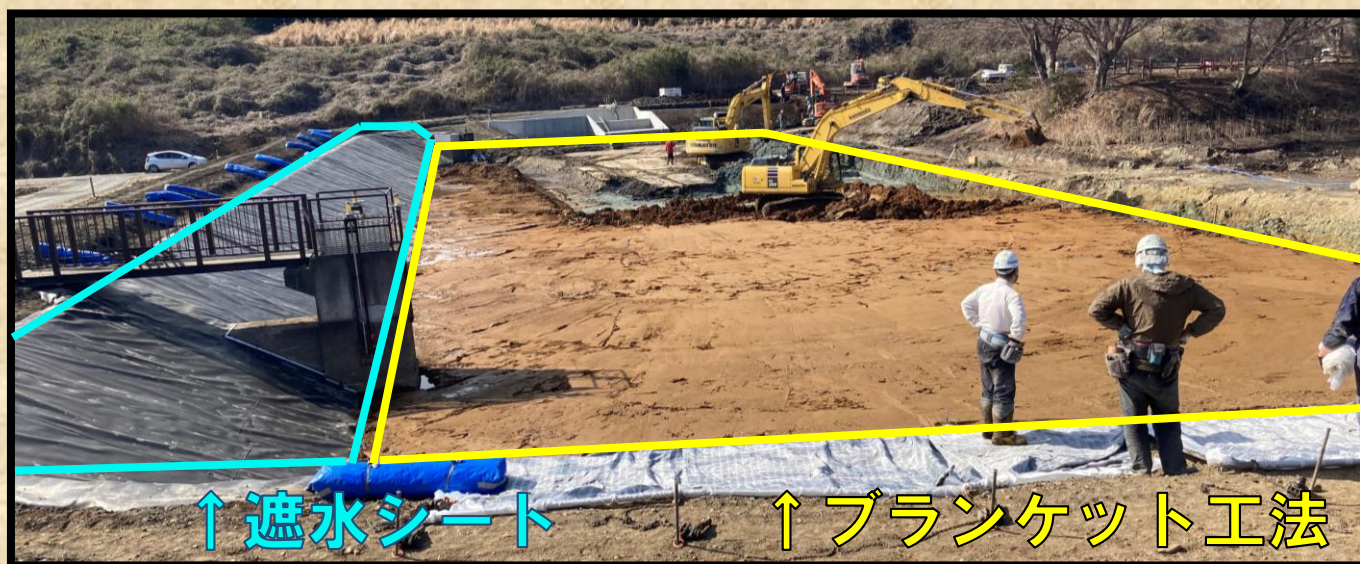

↑ 遮水シート

↑ ブランケット工法

ゴム製の遮水シートが布設されました。
さらに、遮水シートの上に、布製型枠を施工します。
布製の型枠の中にモルタルが注入、硬化することで、遮水シートが固定され、遮水効果が長期間維持されます。
